

**De :** [Mercier, Stéphane \(Ext\)](#)  
**À :** [Foldes-Busque, Caroline](#); [Cloutier, Sylvain](#)  
**Cc :** [Desbiens, Manon \(Ext\)](#); [Bracken, Brigitte \(Ext\)](#); [gleb.dubovets](#) [REDACTED]  
**Objet :** Vélodité scénario.pptx  
**Date :** 24 janvier 2020 12:15:23  
**Pièces jointes :** [Vélodité scénario.pptx](#)

---

Bonjour,

Vous trouverez ci-joint un document de travail qui présente 3 scénarios de vélocité de réalisation de RICEFW.

Ce document à pour but d'alimenter la discussion pour la révision de la stratégie de réalisation. Je vous en convoque en début de semaine pour en discuter.

Merci

Document de travail

## Scénario 1 – selon la cadence mondiale de 60 RICEWF par mois

[illegible]


- Selon la cadence mondiale seulement 69 % des RICEFW serait réalisés à la fin du cycle 10
- Une moyenne de 111 RICEWF serait nécessaire pour réaliser l'ensemble de la solution au cycle 10
- Une moyenne de 90,56 serait nécessaire avec l'ajout du cycle 11
- 69 % de RICEFW réalisés avec l'ajout d'un cycle – 31 % de la portée en mode progressif

## Scénario 2 – selon la cadence de 40 RICEWF par mois

[illegible]

- Selon la cadence de 40 RICEFW seulement 53 % des RICEFW serait réalisés à la fin du cycle 10
- Ajout de 18 mois pour la phase de réalisation
- 61 % de RICEFW réalisés avec l'ajout d'un cycle – 39 % de la portée en mode progressif

### Scénario 3 – selon la cadence de 30 RICEWF par mois

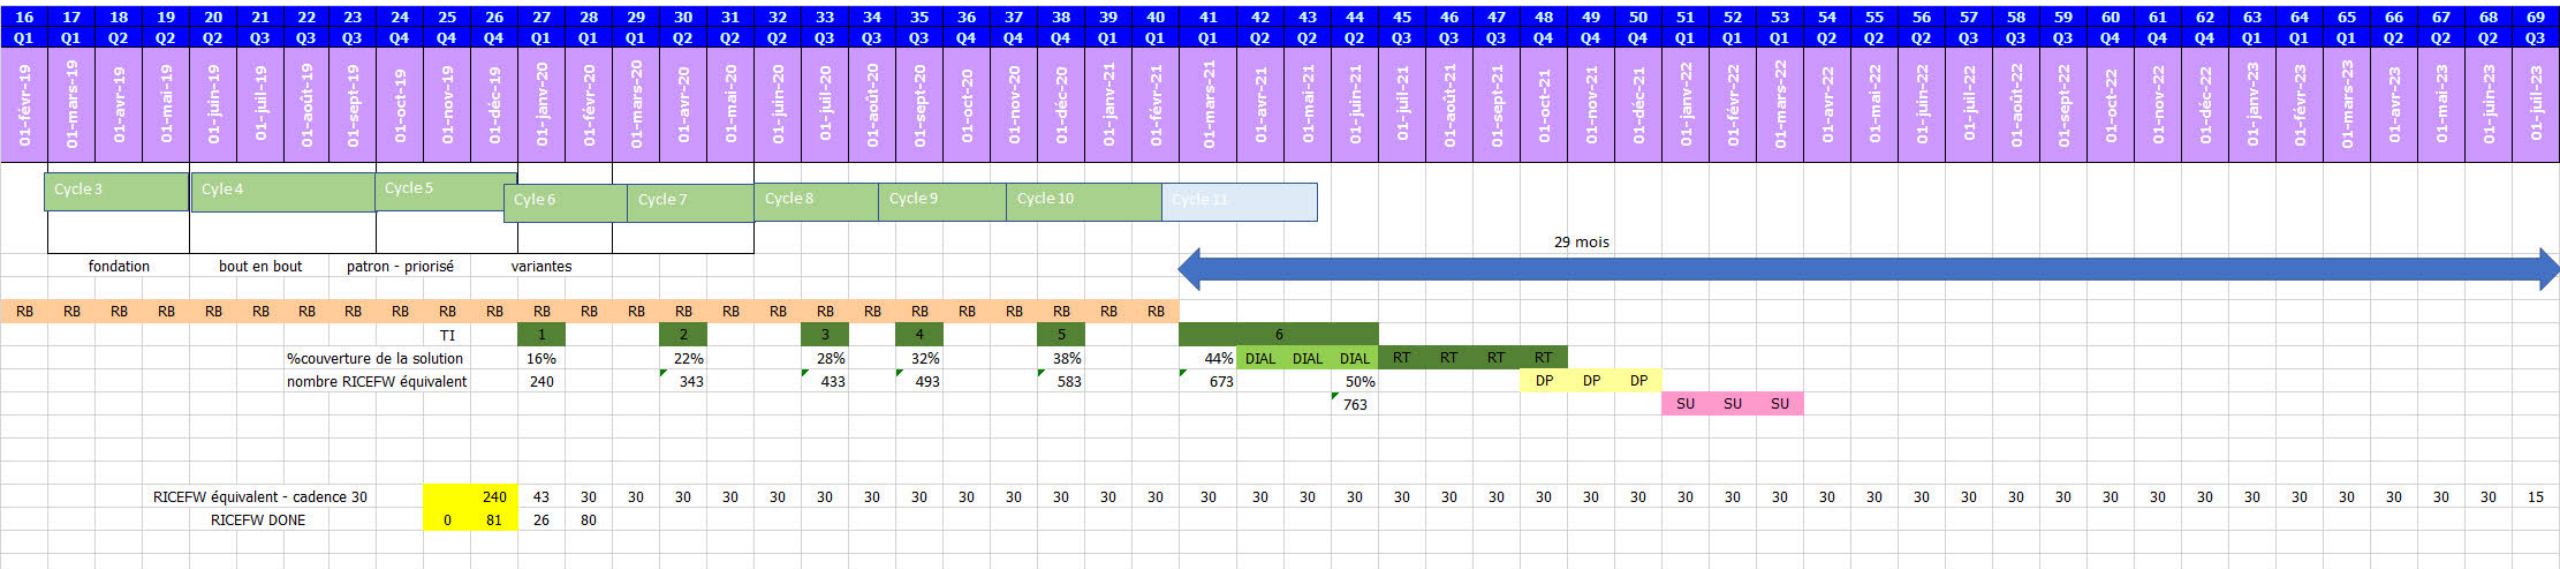

- Selon la cadence 30 RICEFW seulement 44 % des RICEFW serait réalisés à la fin du cycle 10
- Ajout de 29 mois pour la phase de réalisation
- 50 % de RICEFW réalisés avec l'ajout d'un cycle- 50 % de la portée en mode progressif
