

Instructions pour compléter le gabarit du calendrier détaillé de réalisation de la stratégie de mise en oeuvre

Ce gabarit permet à l'Alliance d'illustrer le calendrier de réalisation de la stratégie de mise en oeuvre proposée, soit la représentation du découpage des livraisons au niveau des lots.

Le gabarit du calendrier comprend quatre (4) zones distinctes. Il s'agit:

Zone 1: cette zone contient une légende de couleur pour illustrer les lots correspondants aux principales phases de la méthodologie proposée par l'Alliance.

L'Alliance doit indiquer du côté droit de la zone 1 le nom correspondant à la phase de sa méthodologie.

Zone 2: cette zone permet à l'alliance d'ajouter des couleurs dans la légende afin d'illustrer dans le calendrier des phases ou rubriques additionnelles correspondant à d'autres types de lot.

Zone 3: cette zone illustre le lien entre le calendrier et les années et trimestres des efforts estimés se trouvant dans le tableau des efforts et bordereau de prix correspondant pour les services professionnels.


Zone 4: cette zone permet d'illustrer le découpage en livraison de la stratégie de mise en oeuvre de l'alliance en utilisant la légende et les conventions indiquées.


Lorsque complété, le calendrier doit être inséré dans la section du cahier réponses prévue à cet effet.


[illegible]

LÉGENDE - Phases de la méthodologie en lien avec la stratégie MEO												Code de couleur	nom équivalent de la phase de la méthodologie de l'Alliance												Code de couleur	autres phases / rubriques spécifiques de l'Alliance											
Planification et vision																																					
Conception																																					
Réalisation																																					
Préparation de la mise en production																																					
Mise en production & support postimplantation (3 mois)																																					
Soutien, maintenance et exploitation (Ans 1@5)																																					

Lien avec les années & trimestres du bordereau des efforts		An 1												An 2												An 3												An 4												An 5															
		T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4																		
Années calendrier		2017												2018												2019												2020												2021												2022			
DÉCOUPAGE EN LIVRAISONS		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																
Centre d'excellence : Démarche de transfert progressif vers les ressources de la Société (transfert de connaissance, transfert de responsabilité)																																																																	
Livraison 1 Finances et fondation (OP 1610)		Livraison 0						Préparer, concevoir, former, valider le Centre de support et d'excellence																																																									
Lots		3																																																															
Livraison 1 Finances et fondation (OP 1610)		Livraison 1												Société																																																			
Lots		2 De L0						4						5						6		7		Alliance																																									
														Soutenir, superviser et automatiser. Gérer les incidents et les livraison																																																			
														Valider l'intégration technologique																																																			
Livraison 2 Permis et immatriculation (OP 1610)		Livraison 2																		Alliance																																													
Lots		2 De L0						8						9						10						11						12		13		Optimiser: Prévoir les incidents, gérer les versions logiciels, valider les démarches de qualités																													
Livraison IR Indemniser et réadapter (ALM à OP1907)		Livraison 0						Livraison IR																																										Alliance															
Lots		2 De L0																				14		15		16						17		18		Inovers: Étudier les nouveaux besoins																													
Intégration des revues de qualité de l'éditeur: REVUE DE CONCEPTION		Revue de conception : La revue de conception de l'éditeur permet de s'assurer que l'intégrateur à bien utiliser les fonctionnalités natives de la solution chaque fois que c'était possible, de manière à minimiser le développement sur mesure et de s'assurer de maximiser les bénéfices découlant de l'utilisation de la version commerciale de la solution et conserver les coûts de mise à jour au niveau minimum.																																																															
Livraison 1 Finances et fondation (OP 1610)		Livraison 0																																																															
Lots		3																																																															
Livraison 1 Finances et fondation (OP 1610)		Livraison 1																																																															
Lots		2 De L0						4						5						6		7																																											
Livraison 2 Permis et immatriculation (OP 1610)		Livraison 2																																																															
Lots		2 De L0						8						9						10						11						12		13																															
Livraison IR Indemniser et réadapter (ALM à OP1907)								Livraison IR																																																									
Lots																						14		15		16						17		18																															

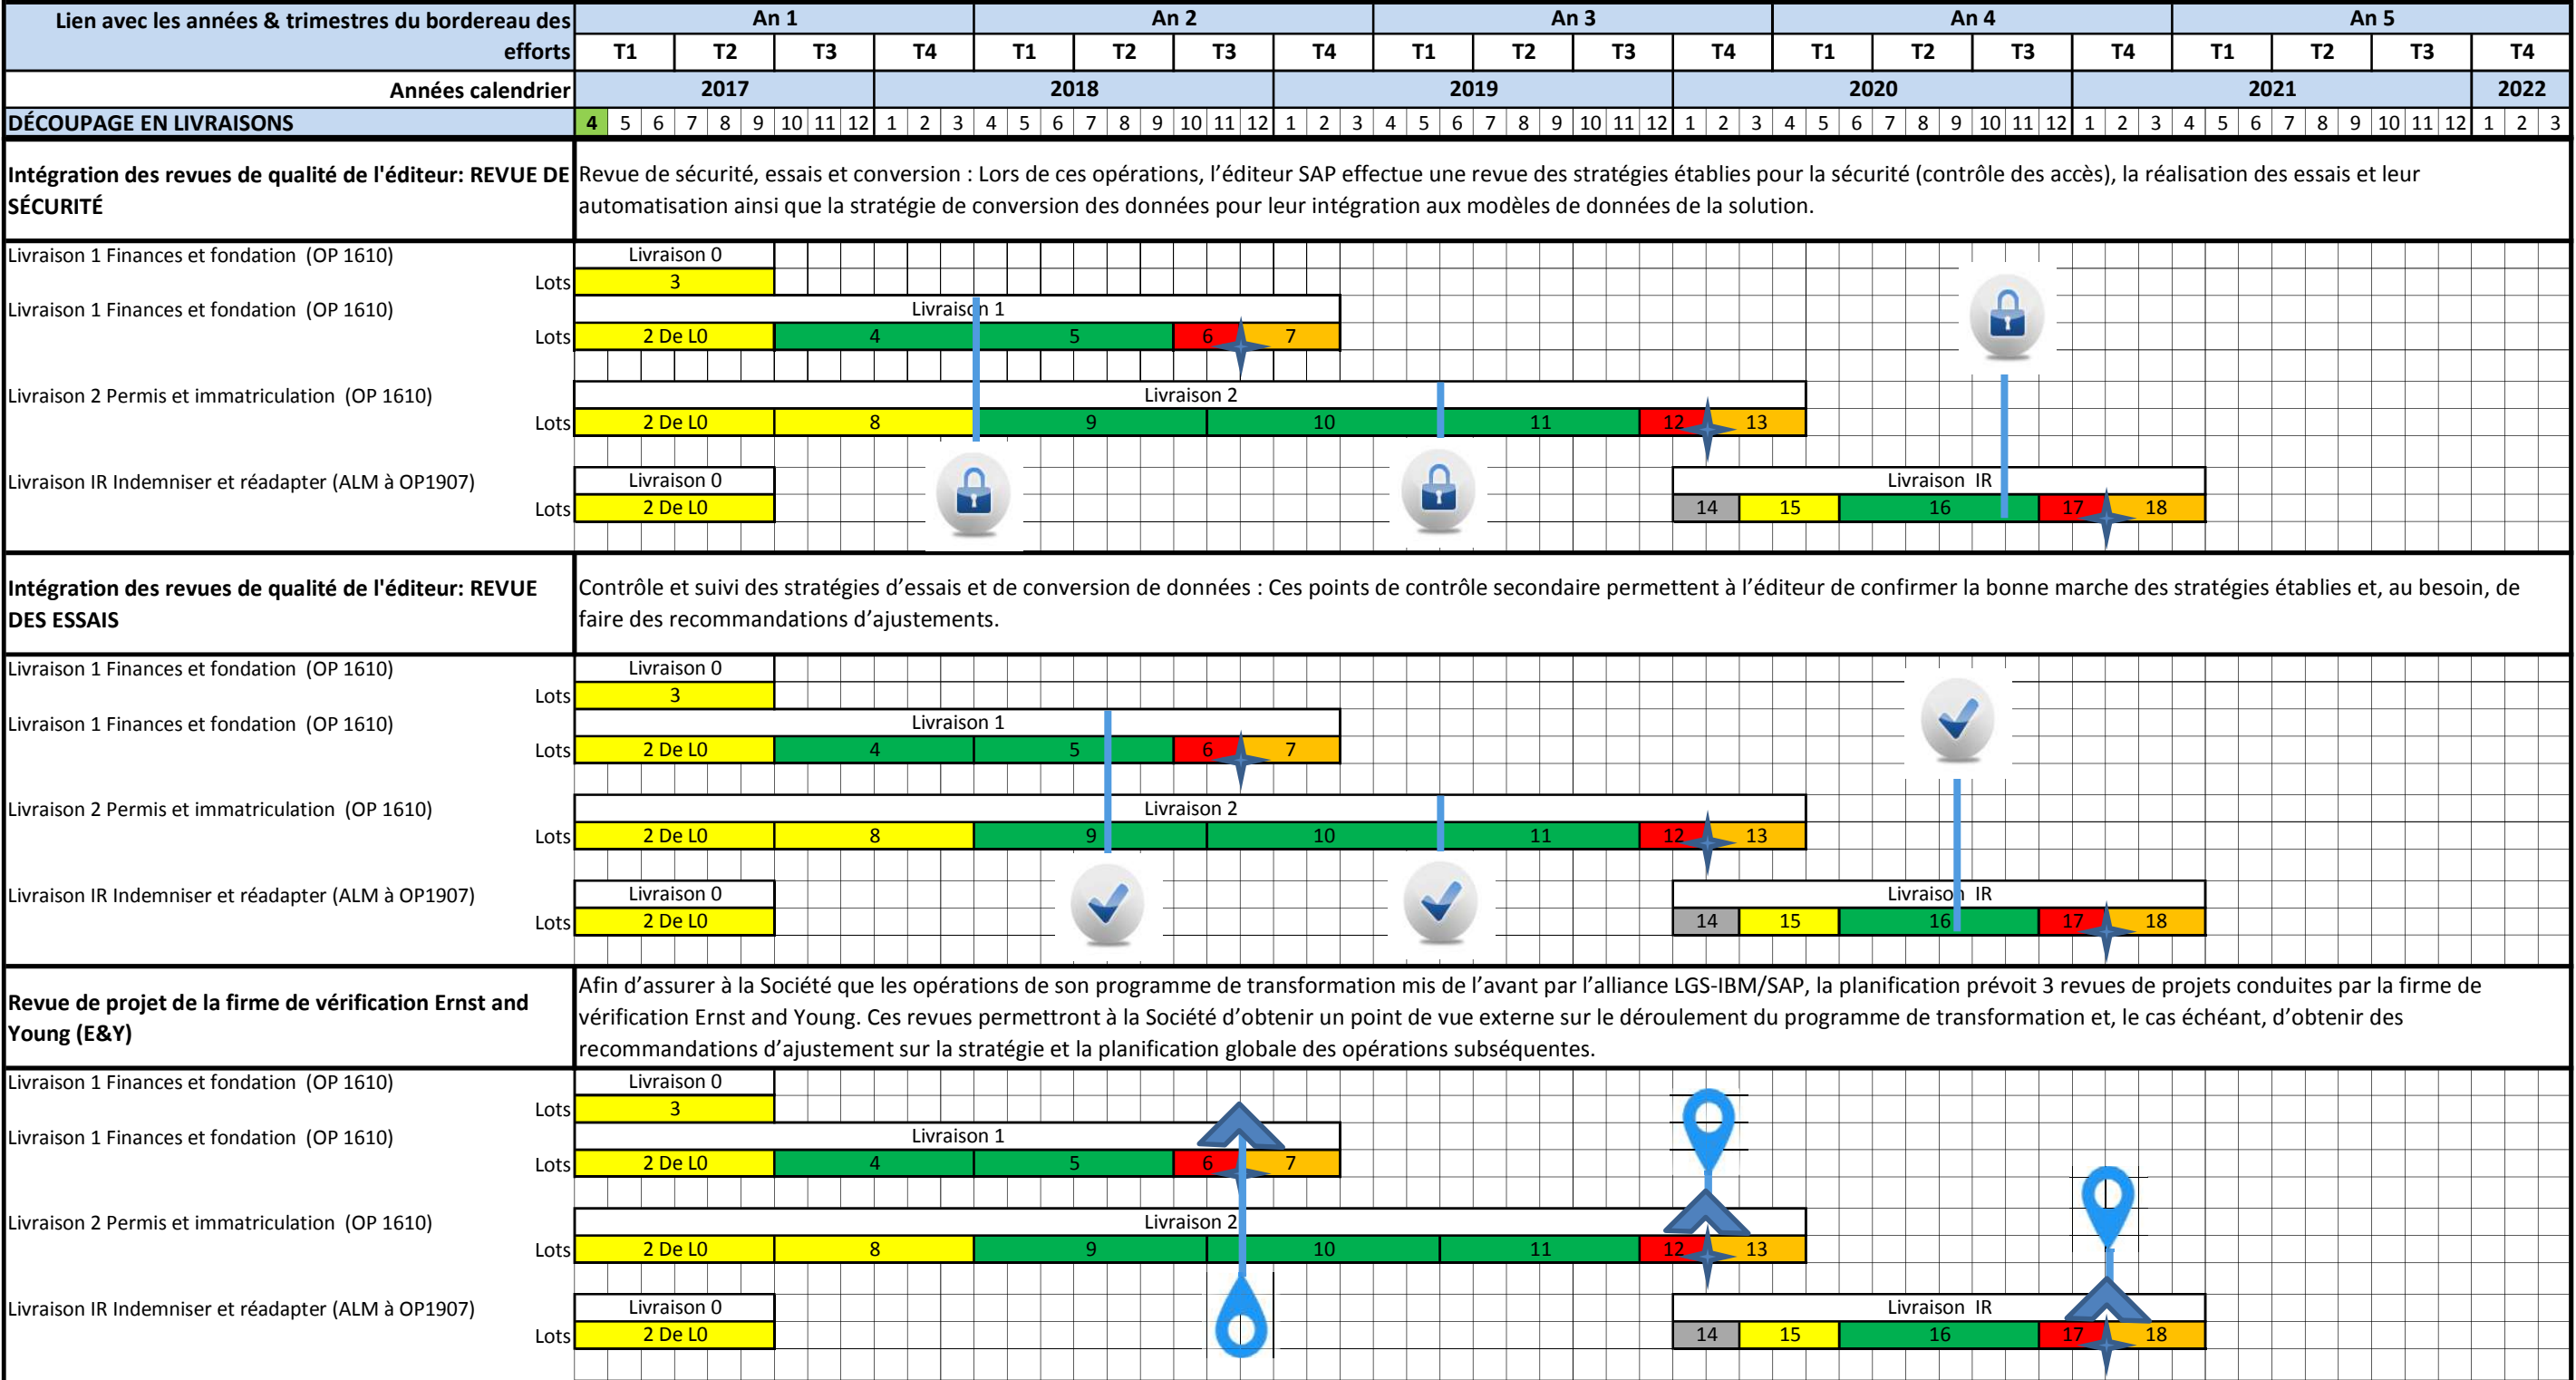

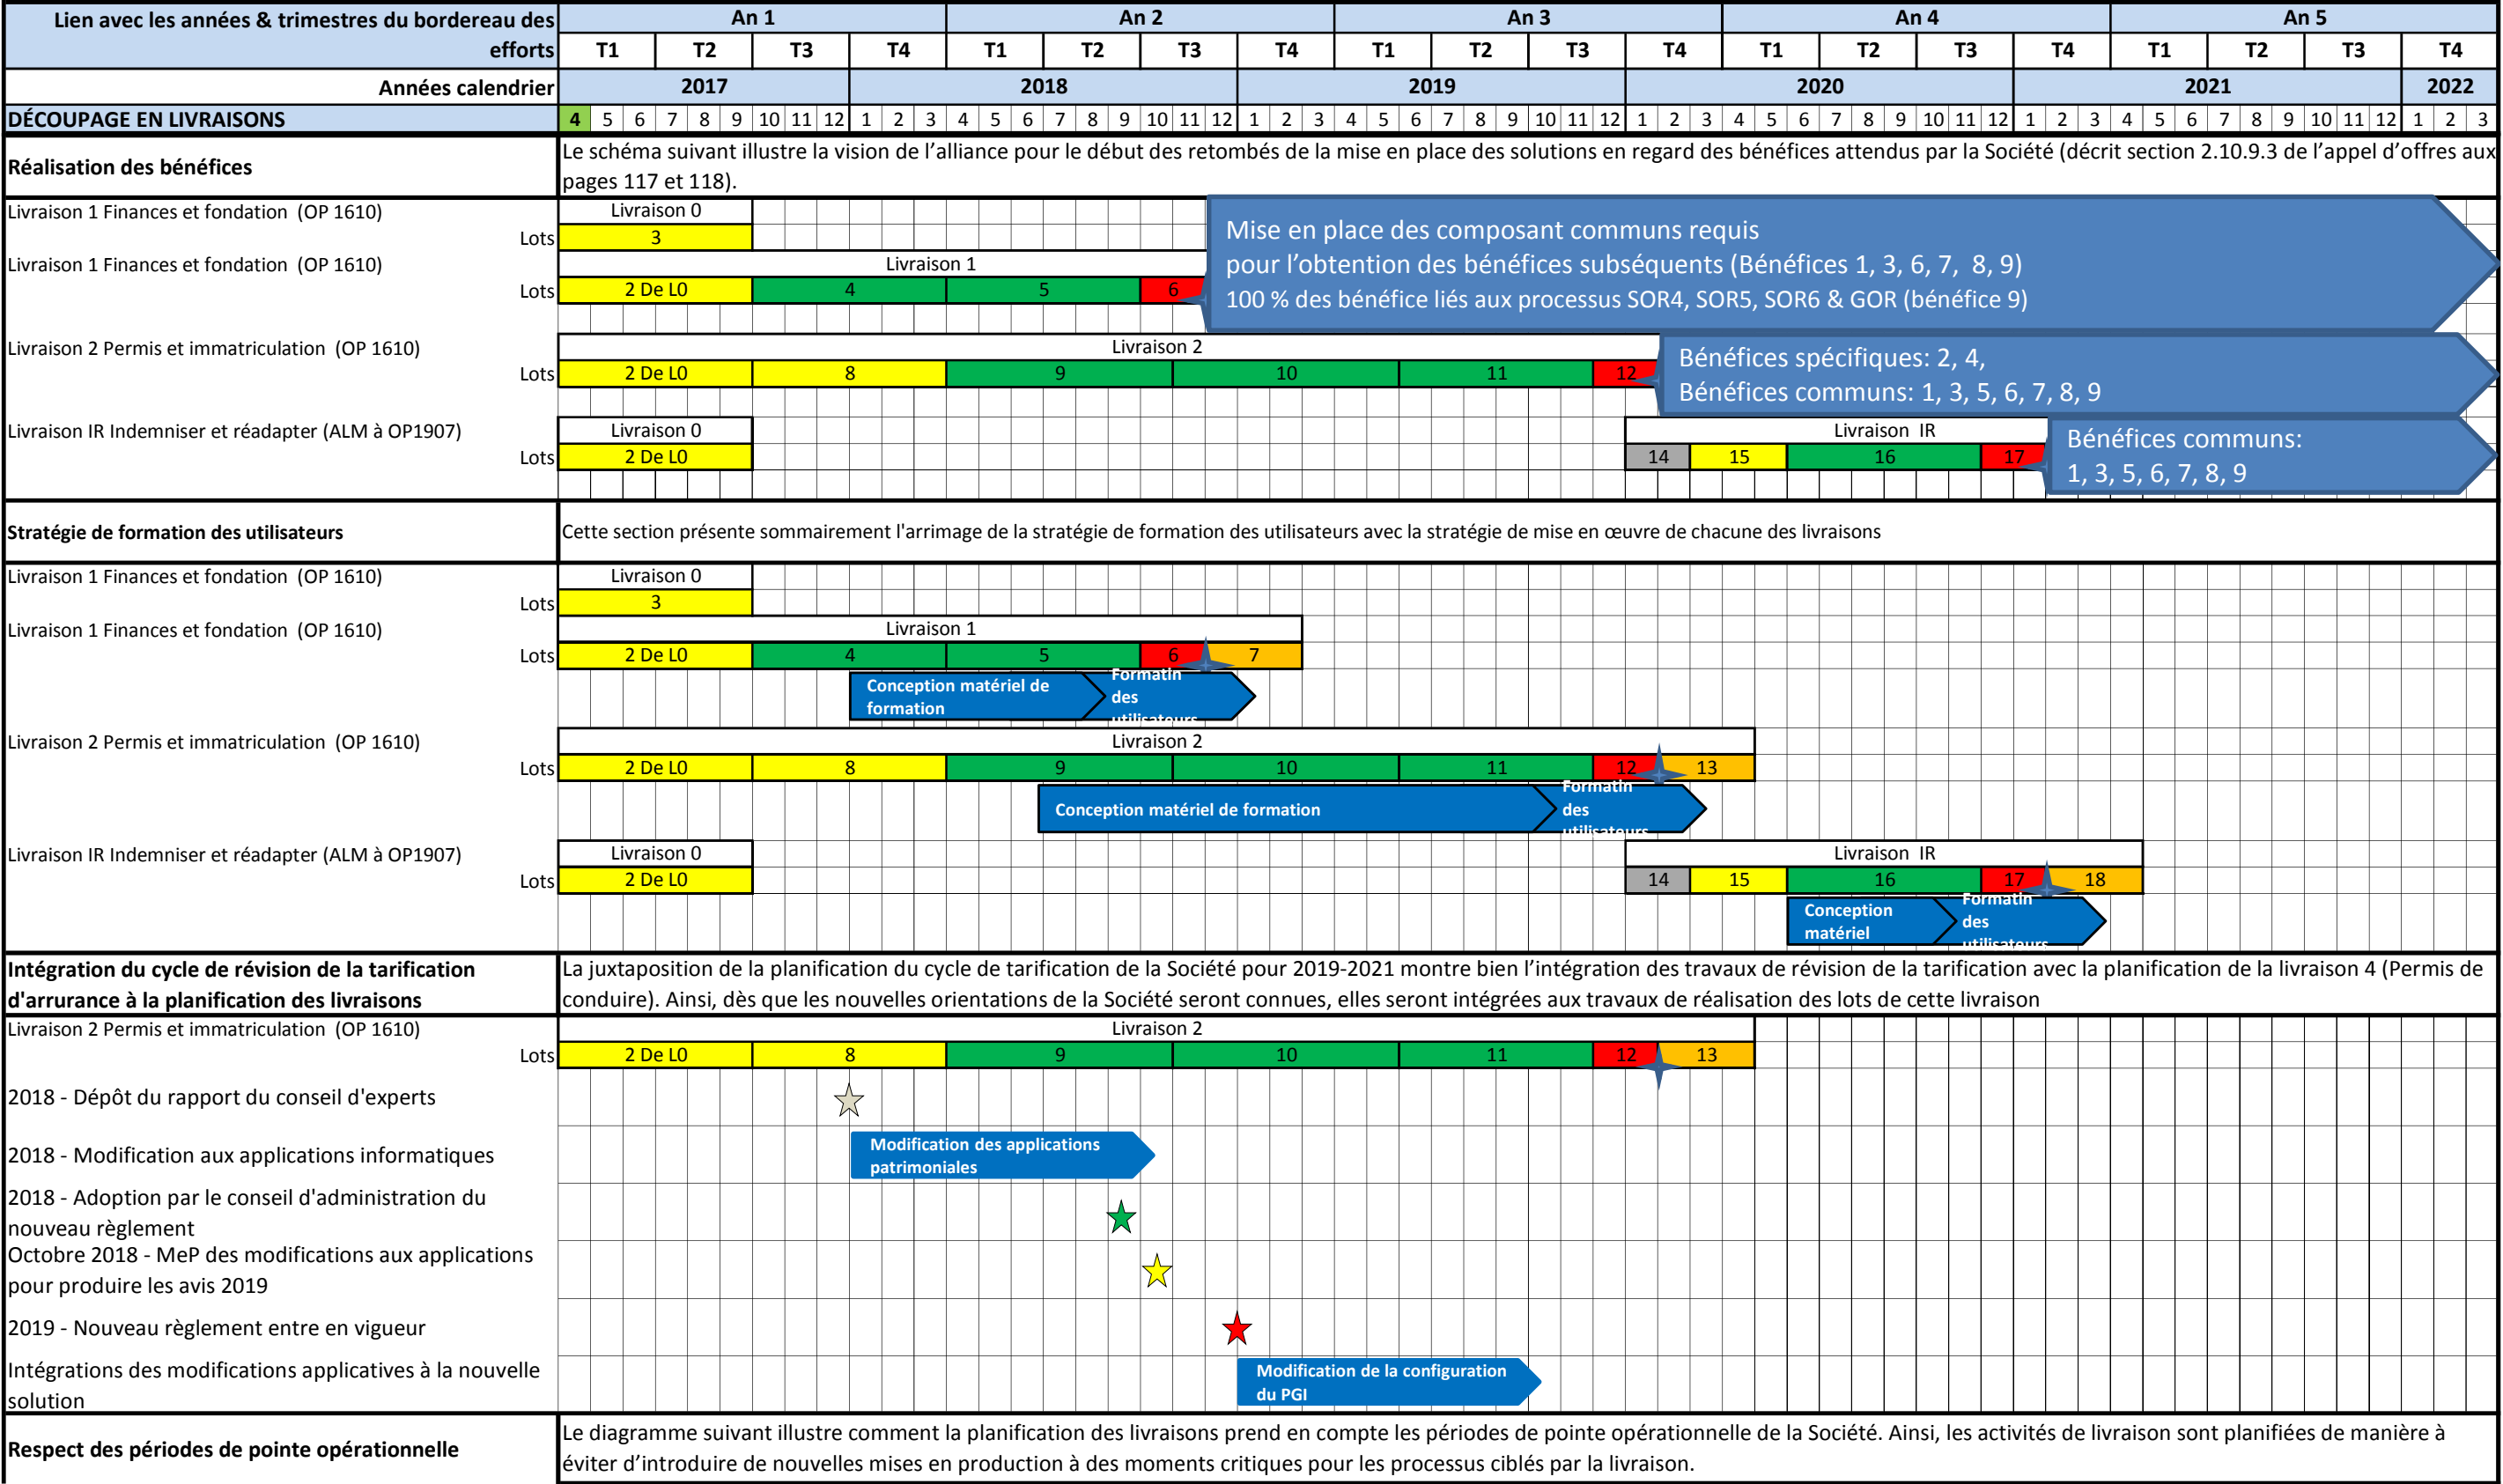

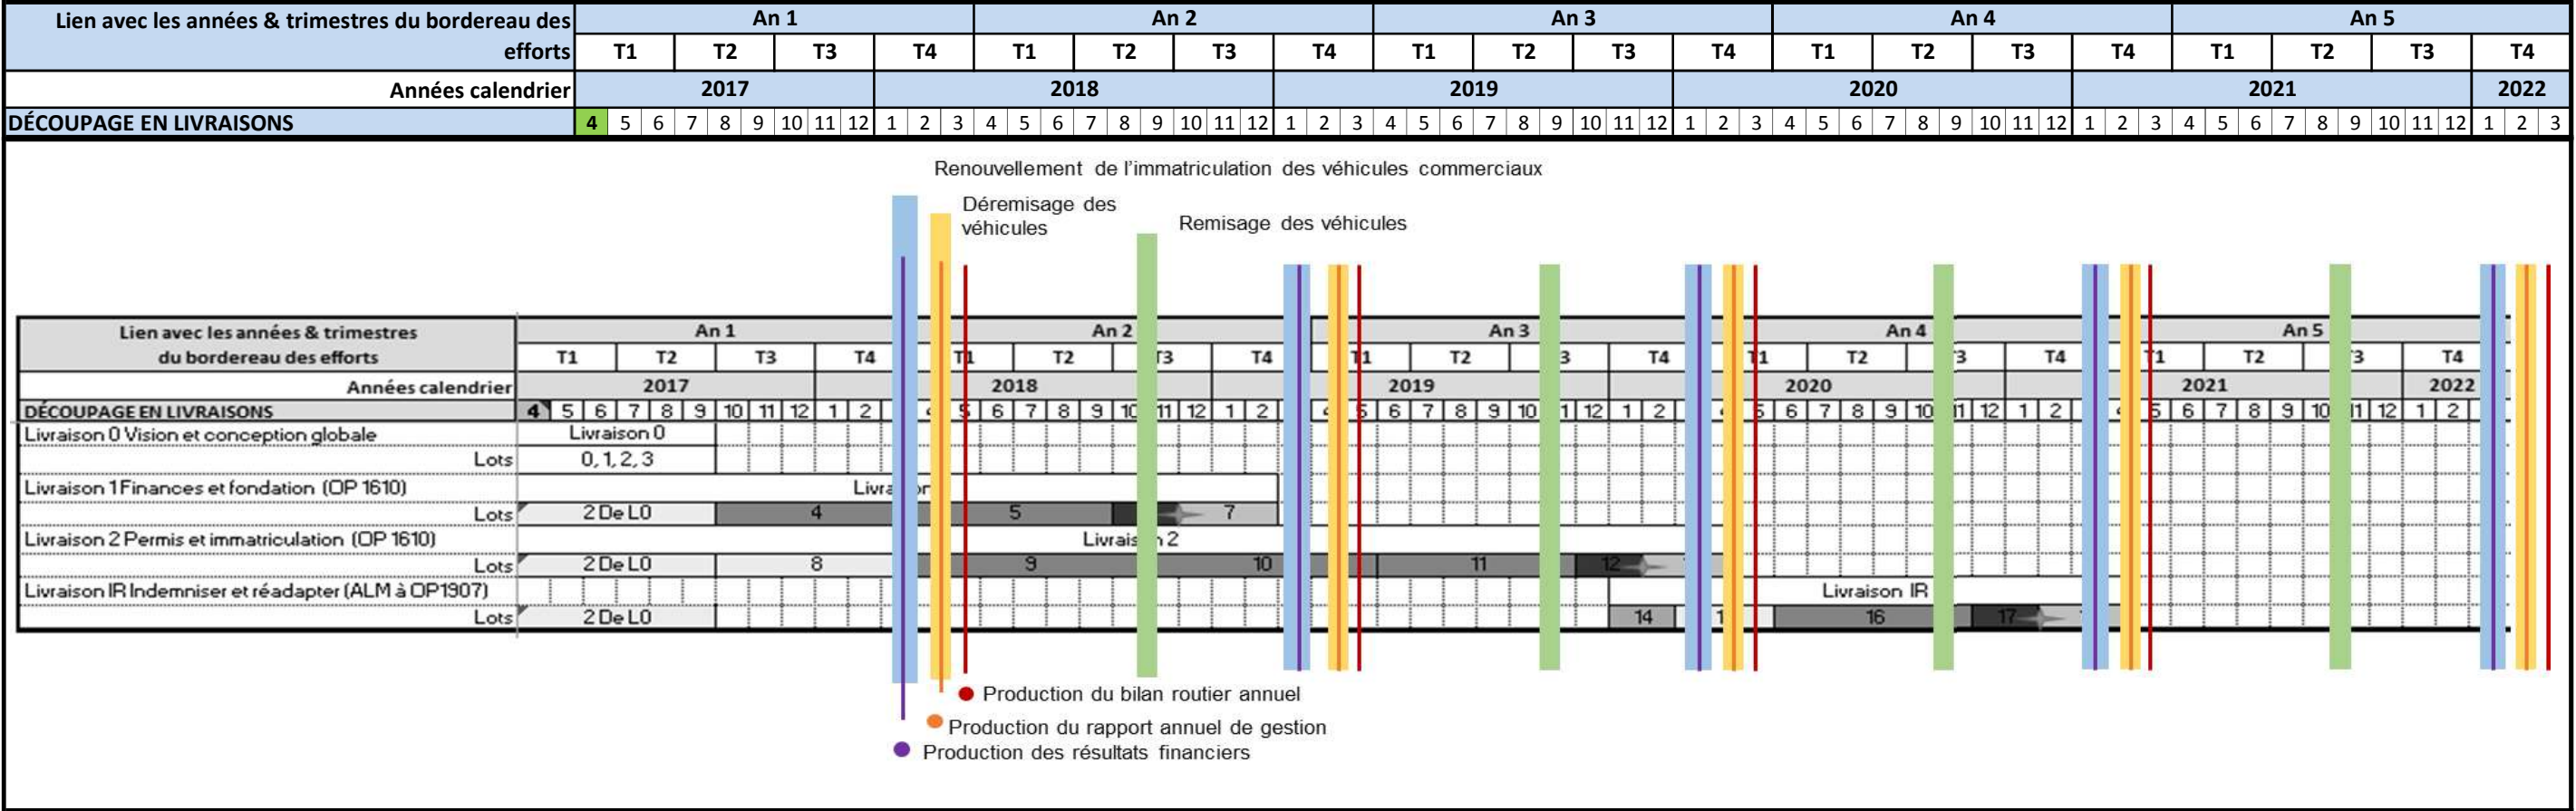

Lien avec les années & trimestres du bordereau des efforts	An 1				An 2				An 3				An 4				An 5																			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4																
Années calendrier	2017				2018				2019				2020				2021				2022															
DÉCOUPAGE EN LIVRAISONS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3												
Proposition d'intégration de la gestion des ressources humaines (SOR4) avec la planification de la livraison 1																																				
Lots de la livraison 1 Préparation / planification Conception Intégration des fonctions de bases Intégration des fonctions complémentaires Préparation du déploiement et formation Essais finaux par l'équipe utilisateur	Livraison 1																																			
	2 De L0				4				5				6		7																					
	1	2	3																																	
	1			2	3	4																														
					1	2	3	4	5	6																										
							1	2	3	4	5	6																								
											1	2																								
Stratégie préconisée pour l'intégration de l'environnement informationnel patrimoniale (CEDO/CIG)																																				
À noter: Durée des sprints de conception et réalisation plus longÀ noter: Durée des sprints de conception et réalisation plus long																																				
Lots de la livraison 1 Planification de l'intégration sur BW Hana Conception de l'entrepôt de destination Phase 1 d'intégration des données patrimoniales Phase 2 d'intégration des données patrimoniales Prép. déploiement et de l'intégration CEDIO/CIG, formation Rodage de l'environnement informationnel	Livraison 1																																			
	2 De L0				4				5				6		7																					
	1	2																																		
	1			2																																
					3	4	5																													
							6	7	8																											
											1	2																								
Stratégie préconisé pour l'intégration du CDP avec les travaux de la livraison 2 en mode Agile et colaboratif Client/Éditeur/Intégrateur																																				
Lots de la livraison 2 Préparation / planification Conception du CDP Réalisation des CDP Infractions (point d'inaptitude)/sanctions Réalisation dossier médical Intégration par l'intégrateur Essais finaux par l'équipe utilisateurs Déploiement et formation Rodage Post GoLive Support	Livraison 2																																			
	2 De L0				8				9				10				11				12		13													
	1	2	3																																	
	1			2	3	4	5																													
					1	2	3	4	5	6																										
							1	2	3	4	5	6	7																							
											1	2	3	4	5	6	7																			
															1	2	3	4	5	6																
																	1	2																		
																			1	2	3															
Année 1 à 5: Stratégie d'ajustement et d'optimisation du dimensionnement des infrastructures et planification d'une mise à jour majeure du PGI																																				
Le schéma ci-dessous illustre les périodes qui sont prévues au cours des 60 premiers mois pour les opérations d'ajustements de capacité des infrastructures pour accroître le «sizing» des infrastructures afin de supporter l’ajout d’utilisateurs, de composants applicatifs et de volume de données et, dans le cas de la livraison IR, d el’intégration d'une nouvelle version majeure du PGI. En plus de celle-ci, , l’alliance recommande la planification de deux autres mises à jour dans les 60 mois subséquents (consulter la rubrique "Année 6 à 10 : Stratégie de mise à jour des des environnements de chacun des paysages").																																				
Livraison 0 Vision et conception globale	Livraison 0																																			
Livraison 1 Finances et fondation (OP 1610)	Lots 0, 1, 2, 3																																			
Livraison 2 Permis et immatriculation (OP 1610)	Lots		Livraison 1																																	
Livraison IR Indemniser et réadapter (ALM à OP1907)	Lots		Livraison 2																																	
Ajustement du dimensionnement	Lots		Livraison 0																																	
L1 : Dimensionnement final			2 De L0																																	
Monitoring & optimisation																																				
L2 : Dimensionnement final																																				
Monitoring & optimisation																																				
LIR : Dimensionnement final																																				
Monitoring & optimisation																																				
Année 1 à 5 : Stratégie de déploiement infrastructures et d'utilisation des environnements de chacun des paysages (N et N+1) pour chacune des livraisons																																				
L1 Configuration																																				
Sandbox	S1																							S1												

10 / 11

Lien avec les années & trimestres du bordereau des efforts	An 1				An 2				An 3				An 4				An 5																			
	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4	T1	T2	T3	T4																
Années calendrier	2017				2018				2019				2020				2021				2022															
DÉCOUPAGE EN LIVRAISONS	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
Production																																				
Site de relève																																				
Légende	Sx : SandBox				si x=1 : Environnement N				Qf : Contrôle qualité - secondaire (mode Agile)				Pp : Pré-Production					= Configuration initiale																		
	Dx : Development				si x=2 : Environnement N+1				Qc : Contrôle qualité dédié pour la conversion				(Note: dédié à la conversion en L1)					= Recyclage pour le nouveau paysage																		
	Qx : Contrôle qualité												Pr :Production					= Reconfiguration nouveaux paysage																		
	Tx : Formation												Dr : Disaster Recovery					= Fin d'utilisation / Recyclage en capacité																		
